

## BAB III

### RENCANA KEGIATAN, CAPAIAN, DAN SERAPAN ANGGARAN TENGAH TAHUN

#### A. MATRIKS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI SEMESTER I

Satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah pada tengah tahun 2014 melaksanakan kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala dengan rencana kerja dan anggaran, target dan realisasi hingga tengah tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKTIFITAS	RENCANA			TARGET SEMESTER I				REALISASI SEMESTER I			
		VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	%	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
023.15.12	Program Pelestarian Budaya			36.635.730.000			17.043.233.150				10.796.150.706	29,47%
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala			36.635.730.000			17.043.233.150				10.796.150.706	29,47%
5181.001	Cagar Budaya yang Dilestarikan	59	cagar budaya	3.538.241.000	34	cagar budaya	489.247.850	13,83%	91	cagar budaya	334.430.190	9,45%
5181.002	Cagar Budaya yang Dikelola	72	cagar budaya	6.838.614.000	60	cagar budaya	4.160.870.950	60,84%	19	cagar budaya	1.544.835.855	22,59%
5181.003	Cagar budaya yang diinventarisasi	110	cagar budaya	178.604.000	110	cagar budaya	174.722.000	97,83%	645	cagar budaya	105.939.700	59,32%
5181.004	Naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	1	cagar budaya	89.188.000	-	cagar budaya	-	0,00%	-	cagar budaya	-	0,00%
5181.005	Peserta internalisasi Cagar Budaya	3.063	peserta	389.125.000	1.063	peserta	153.687.000	39,50%	63	peserta	43.461.900	11,17%
5181.006	Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	2	cagar budaya	108.693.000	2	cagar budaya	108.693.000	100,00%	1	cagar budaya	3.494.700	3,22%
5181.010	Peserta Bimbingan teknis Pelestarian cagar Budaya	36	peserta	30.270.000	-	peserta	803.000	2,65%	-	peserta	-	0,00%
5181.994	Layanan Perkantoran	12	bulan layanan	22.910.144.000	6	bulan layanan	11.194.615.100	48,86%	6	bulan layanan	8.734.410.961	38,12%
5181.996	Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	72	unit	575.348.000	1	unit	172.604.400	30,00%	-	unit	-	0,00%
5181.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	236	unit	711.603.000	1	unit	213.480.900	30,00%	-	unit	-	0,00%
5181.998	Gedung/Bangunan	1.107	m2	1.265.900.000	-	m2	374.508.950	29,58%	-	m2	29.577.400	2,34%

#### B. TARGET DAN REALISASI PER OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian aktifitas pada kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala hingga tengah tahun 2014 sebagai berikut :

## 1. Output Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pada tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 59 (lima puluh sembilan) cagar budaya dengan aktifitas berupa Pemugaran Bangunan Cagar Budaya, Asistensi dan Pendampingan Terhadap Pemprov, Pemkot, dan Pemkab dalam Rangka Penilaian Dampak Renbang, Penanganan Kasus Pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya, Penilaian Temuan Cagar Budaya, Pemberian Imbalan Temuan Cagar Budaya, Peninjauan, Penyelamatan, Pengamanan Temuan Cagar Budaya dan Pemantauan Kondisi Cagar Budaya.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 91 (sembilan puluh satu) cagar budaya dengan prosentase 154,24 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 334.400.190,00 atau sebesar 9,45 persen.

Berikut uraian dari masing-masing aktifitas di Output Cagar Budaya yang dilestarikan, yaitu :

- a. Nama aktifitas : PEMUGARAN BENTENG VASTENBURG KOTA SURAKARTA TAHAP II
- Tempat pelaksanaan : Kota Surakarta
- Waktu pelaksanaan : Maret – November 2014
- Metode Pelaksanaan : Kontraktual
- Pelaksana Kegiatan : Perencanaan, Pelaksanaan konstruksi dan Pengawasan dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk pengelolaan kegiatan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan
- Hasil Kegiatan : - Pengadaan langsung untuk konsultan perencana

- Rapat koordinasi untuk menjaring aspirasi terkait dengan pemugaran Benteng Vastenburg Surakarta Tahap II dengan melibatkan stakeholder yang terkait
- Dalam proses e-lelang pemilihan langsung untuk pelaksana konstruksi dan pengadaan langsung untuk konsultan pengawas

Dokumentasi Kegiatan



*Rencana pengecatan dinding luar*




*Pembuatan nama bangunan/ lettering*

b.	Nama aktifitas	:	KONSOLIDASI BAGIAN KAKI DAN TUBUH MASJID AL AQSA KABUPATEN KUDUS
	Tempat pelaksanaan	:	Kabupaten Kudus
	Waktu pelaksanaan	:	April – Desember 2014
	Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
	Pelaksana Kegiatan	:	Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan dan alat pemugaran dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Progress kegiatan	:	Dalam pelaksanaan
	Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan berupa koordinasi/diskusi perencana, pelaksana, dan pengawas dengan narasumber ahli yang ditunjuk dan Ketua YMMSK sebagai pemilik bangunan serta pengadaan alat dan bahan pemugaran</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Pemasangan perancah</li> <li>- Pembongkaran bagian tubuh yang rusak secara parsial</li> <li>- Pemasangan bata baru (sistem kosod)</li> <li>- Grouting struktur isian</li> </ul>

Dokumentasi Kegiatan



*Pemasangan perancah*

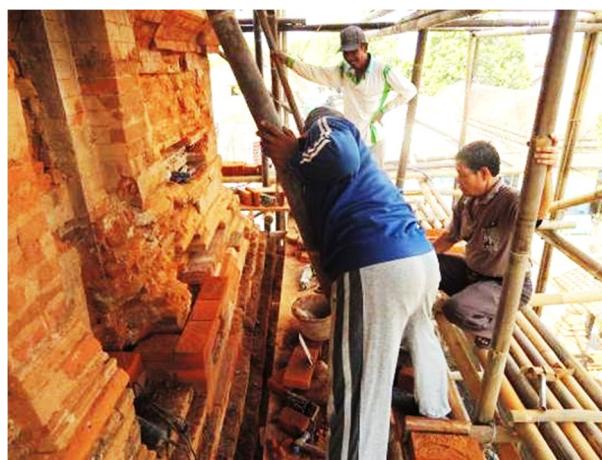

*Pembongkaran parsial*



*Pemasangan kembali bata baru*

- c. Nama aktifitas : REHABILITASI MENARA EKS BANGUNAN PTPN XV KOTA SEMARANG TAHAP II
- Tempat pelaksanaan : Kota Semarang
- Waktu pelaksanaan : Maret – Desember 2014
- Metode Pelaksanaan : Kontraktual
- Pelaksana Kegiatan : Perencanaan, Pelaksanaan konstruksi dan Pengawasan dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk pengelolaan kegiatan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan

Hasil Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review lanjutan pelaksanaan konstruksi tahap II oleh Konsultan Perencana</li> <li>- Dalam proses e-lelang pemilihan langsung untuk pelaksana konstruksi dan pengadaan langsung untuk konsultan pengawas.</li> </ul>
d. Nama aktifitas	: REHABILITASI CUNGKUP DAN PAGAR SISI DEPAN MAKAM RATU KALINYAMAT KOMPLEKS MAKAM MANTINGAN KABUPATEN JEPARA
Tempat pelaksanaan	: Kabupaten Jepara
Waktu pelaksanaan	: Maret – Desember 2014
Metode Pelaksanaan	: Kontraktual
Pelaksana Kegiatan	: Perencanaan, Pelaksanaan konstruksi dan Pengawasan dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk pengelolaan kegiatan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Progress kegiatan	: Dalam pelaksanaan
Hasil Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan langsung untuk konsultan perencana</li> <li>- Rapat koordinasi untuk menjaring aspirasi terkait dengan Rehabilitasi Cungkup dan Pagar Sisi Depan Makam Ratu Kalinyamat Kompleks Mantingan, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten</li> </ul>

Jepara, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Ahli Arkeologi dan Takmir  
Masjid Sultan Hadlirin

- Dalam proses e-lelang pemilihan langsung untuk pelaksana konstruksi dan pengadaan langsung untuk konsultan pengawas.

Dokumentasi Kegiatan :



*Cungkup Makam Ratu Kalinyamat*



*Rapat koordinasi perencanaan rehabilitasi cungkup dan pagar sisi depan makam Ratu Kalinyamat*

- e. Nama aktifitas : PEMBERIAN IMBALAN TEMUAN CAGAR BUDAYA HASIL PENILAIAN TAHUN 2013
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Temanggung
- Waktu pelaksanaan : Maret 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- Progress kegiatan : Telah dilaksanakan
- Hasil Kegiatan : Pemberian imbalan temuan cagar budaya hasil penilaian tahun 2013 dan diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya
- Dokumentasi Kegiatan :



*Pemberian imbalan temuan cagar budaya hasil penilaian tahun 2013*

f. Nama aktifitas	:	ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEMPROV, PEMKOT, DAN PEMKAB DALAM RANGKA PENILAIAN DAMPAK RENBANG
Tempat pelaksanaan	:	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah
Waktu pelaksanaan	:	Januari – Desember 2014
Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
Pelaksana Kegiatan	:	Personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Progress kegiatan	:	Dalam pelaksanaan
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Asistensi dan pendampingan dampak rencana pembangunan Gedung BPD Kabupaten Boyolali dan Pendopo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali;</li> <li>2) Koordinasi renovasi pendopo Tajug, Paseban, Cungkup Makam dan Tembok di Kompleks Masjid Menara Kudus;</li> <li>3) Koordinasi dan kunjungan lapangan revitalisasi Ponten Kestalan (peninggalan Mangkunegara VII) Kota Surakarta;</li> <li>4) Asistensi dan pendampingan dampak rencana pembangunan cagar budaya di Jl. Semeru No. 2 dan No. 4 serta Eks Gedung Manage Kota Salatiga;</li> <li>5) Koordinasi pemanfaatan Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang;</li> </ul>

- 6) Koordinasi pemugaran Gedung Juang 45 Kota Surakarta;
- 7) Koordinasi permohonan pencabutan status bangunan cagar budaya di Jl. Diponegoro No. 165 Kota Salatiga;
- 8) Koordinasi persiapan pekerjaan penataan Bunker Balai Kota Surakarta;
- 9) Pembahasan alih fungsi/pemanfaatan bangunan cagar budaya di Jl. Yos Sudarso No. 19 Kota Salatiga;
- 10) Asistensi dan pendampingan dampak rencana pembangunan Disdukcapil Kabupaten Kudus;
- 11) Asistensi dan pendampingan dampak rencana pembangunan Polsek Limpung Kabupaten Batang;
- 12) Koordinasi rencana rekonstruksi bangunan eks Kodim Kota Salatiga;
- 13) Koordinasi rencana pembangunan cungkup baru di Kompleks Makam Tegal Arum Kabupaten Tegal

g.	Nama aktifitas	:	PENANGANAN KASUS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA
	Tempat pelaksanaan	:	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah
	Waktu pelaksanaan	:	Januari – Desember 2014
	Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
	Pelaksana Kegiatan	:	Personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Progress kegiatan	:	Dalam pelaksanaan
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan potensi pelanggaran UU No. 11 Th. 2010 terhadap gedung SJS Kota Semarang;</li> <li>2) Tindak lanjut Surat Disporabudpar Kabupaten Banyumas No. 430/123/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal mohon bantuan/saran penanganan Cagar Budaya.</li> </ul>
h. Nama aktifitas	:	PENINJAUAN, PENYELAMATAN, PENGAMANAN TEMUAN CAGAR BUDAYA DAN PEMANTAUAN KONDISI CAGAR BUDAYA
Tempat pelaksanaan	:	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah
Waktu pelaksanaan	:	Januari – Desember 2014
Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
Pelaksana Kegiatan	:	Tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Progress kegiatan	:	Dalam pelaksanaan
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Peninjauan rumah tinggal di Jl. Dr. Wahidin Kota Semarang;</li> <li>2) Pemantauan kinerja juru pelihara dan satpam serta pemantauan kondisi cagar budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah;</li> </ul>

- 3) Peninjauan temuan cagar budaya di Dusun Candi Desa Kebon Agung Kecamatan Tanor Kabupaten Sragen;
- 4) Pengamanan dan penyelamatan temuan cagar budaya Candi Losari Kabupaten Magelang;
- 5) Peninjauan temuan cagar budaya di Dusun Candi Desa Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

Dokumentasi Kegiatan



*Potensi cagar budaya hasil peninjauan*

## 2. Output Cagar Budaya yang Dikelola

Pada tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 72 (tujuh puluh dua) cagar budaya dengan aktifitas berupa Zonasi, Pemugaran, Konservasi, Pembuatan/Perbaikan Prasarana Perlindungan, Penataan Lingkungan, Pembebasan dan Sertifikasi Tanah, Sewa Tanah, dan Ekskavasi Penyelamatan.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 19 (sembilan belas) cagar budaya dengan prosentase 26,39 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.544.835.855,00 atau sebesar 22,59 persen.

Berikut uraian dari masing-masing aktifitas di Output Cagar Budaya yang dikelola, yaitu :

- a. Nama aktifitas : ZONASI SITUS MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR
- Tempat pelaksanaan : Kota Surakarta
- Waktu pelaksanaan : Maret – April 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- Progress kegiatan : Telah dilaksanakan
- Hasil Kegiatan : Adanya upaya perlindungan cagar budaya dengan membuat area perlindungan yang terdiri dari 4 (empat) zona, yaitu :
  - zona inti*, yaitu : area pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya
  - zona penyangga*, yaitu : area yang melindungi zona inti
  - zona pengembangan*, yaitu area yang diperuntukkan untuk pengembangan potensi cagar budaya atau penataan lingkungan untuk meningkatkan nilai cagar budaya.
  - Zona penunjang*, yaitu : area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang berupa tempat rekreasi dan fasilitas pengunjung

Dokumentasi Kegiatan



*Survey lapangan*



*Pemetaan dan penggambaran*



- b. Nama aktifitas : KONSERVASI CANDI NGEMPON KABUPATEN SEMARANG
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Semarang
- Waktu pelaksanaan : Juni – Juli 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Progress kegiatan : Telah dilaksanakan
- Hasil Kegiatan : Terpeliharanya cagar budaya dari kerusakan lebih lanjut

Dokumentasi Kegiatan :



*Pembersihan kering*



*Treatment*



*Candi Ngempon setelah dikonservasi*

- c. Nama aktifitas : KONSERVASI CANDI APIT NO. 6, PERWARA DERET III NO. 49 DAN PERWARA DERET IV NO. 64  
KOMPLEKS CANDI SEWU KABUPATEN KLATEN
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Semarang
- Waktu pelaksanaan : April – Mei 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Progress kegiatan : Telah dilaksanakan

Hasil Kegiatan : Terpeliharanya cagar budaya dari kerusakan lebih lanjut

Dokumentasi Kegiatan :



*Pembersihan kering*



*Treatment*



*Candi Apit No. 6 setelah dikonservasi*

d. Nama aktifitas	:	KONSERVASI CANDI PERWARA DERET I NO. 6, DERET II NO. 2 DAN 7 KOMPLEKS CANDI PLAOSAN KIDUL KABUPATEN KLATEN
Tempat pelaksanaan	:	Kabupaten Semarang
Waktu pelaksanaan	:	Mei – Juni 2014
Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
Pelaksana Kegiatan	:	Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
Progress kegiatan	:	Telah dilaksanakan
Hasil Kegiatan	:	Terpeliharanya cagar budaya dari kerusakan lebih lanjut

Dokumentasi Kegiatan :



*Pembersihan kering*



*Treatment*



*Candi Perwara Deret I No. 6 setelah dikonservasi*

- e. Nama aktifitas : REHABILITASI PASCA GEMPA CANDI PERWARA NO. 13 KOMPLEKS CANDI LUMBUNG KABUPATEN KLATEN
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Klaten
- Waktu pelaksanaan : Mei – Nopember 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola

Pelaksana Kegiatan : Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan dan alat pemugaran serta pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan

Hasil Kegiatan : - Pemasangan perancah  
- Pembongkaran bangunan



*Pembongkaran bagian atap*



*Pembongkaran bagian kaki*

- f. Nama aktifitas : RESTORASI CANDI PERWARA DERET I NO. 14 KOMPLEKS CANDI SEWU KABUPATEN KLATEN
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Klaten
- Waktu pelaksanaan : Mei – Nopember 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan dan alat pemugaran serta pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan
- Hasil Kegiatan : - Pembongkaran bangunan insitu

- Penggalian tanah
- Pemasangan bouwplank
- Penandaan dan registrasi batu
- Pencarian batu
- Pemindahan batu dan pembuatan susunan percobaan
- Pengurugan sirtu dan pemasangan tanah
- Pasangan pondasi batu gundul dengan hidrolik mortar
- Pemasangan kembali bagian kaki

Dokumentasi Kegiatan :



*Pembongkaran dan penggalian*



*Pasangan pondasi batu kali spesi hidrolik mortar*



*Pemasangan kembali*

- g. Nama aktifitas : RESTORASI CANDI PERWARA DERET I NO. 8 KOMPLEKS CANDI PLAOSAN LOR KABUPATEN KLATEN  
Tempat pelaksanaan : Kabupaten Klaten  
Waktu pelaksanaan : Mei – Nopember 2014

Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
Pelaksana Kegiatan	:	Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan dan alat pemugaran serta pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
Progress kegiatan	:	Dalam pelaksanaan
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembongkaran bangunan insitu</li> <li>- Penggalian tanah</li> <li>- Pemasangan bouwplank</li> <li>- Penandaan dan registrasi batu</li> <li>- Pencarian batu</li> <li>- Pemindahan batu dan pembuatan susunan percobaan</li> <li>- Pengurugan sirtu dan pematatan tanah</li> <li>- Pasangan pondasi batu gundul dengan hidrolik mortar</li> <li>- Pemasangan kembali bagian kaki</li> </ul>

Dokumentasi Kegiatan



Penyusunan Batu Kaki Lapis 1 (Dumpal Kaki)



Penyusunan Batu Bagian Tangga (Bagian Pipi Tangga)



Penyusunan Batu Candi Lapis 7 (Bagian Sudut Selasar)

- h. Nama aktifitas : RESTORASI CANDI BUBRAH KABUPATEN KLATEN TAHAP II
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Klaten
- Waktu pelaksanaan : Mei – Desember 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan dan alat pemugaran serta pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan
- Hasil Kegiatan : - Pemindahan batu, pembongkaran susunan percobaan dan penyetelan balik

- Konservasi batu
- Penelitian tanah (bor dan sondir)
- Pemasangan kembali bagian kaki

Dokumentasi Kegiatan

:



*Penelitian tanah (bor dan sondir)*



*Konservasi batu*



Pemasangan kembali

- i. Nama aktifitas : REHABILITASI CANDI BIMA KOMPLEKS CANDI DIENG KABUPATEN BANJARNEGARA TAHAP III
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Banjarnegara
- Waktu pelaksanaan : Mei – Nopember 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Perencana, Pelaksana dan Pengawas dilakukan oleh oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan bahan dan alat pemugaran serta pengadaan bahan kimia dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan
- Hasil Kegiatan : - Pemindahan batu, pembongkaran susunan percobaan dan penyetelan balik

- Konservasi batu
- Pemasangan kembali bagian atap

Dokumentasi Kegiatan :



*(Pemasangan katrol untuk menaikkan batu candi)*



*Pemasangan kembali*



*Hasil pemasangan kembali di lapis 38*

- j. Nama aktifitas : SERTIFIKASI TANAH CANDI GUNUNG WUKIR KABUPATEN MAGELANG, SERTIFIKASI TANAH CANDI SELOGRIYO KABUPATEN MAGELANG, SERTIFIKASI TANAH CANDI PRINGAPUS KABUPATEN TEMANGGUNG
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung
- Waktu pelaksanaan : Januari – Desember 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan
- Hasil Kegiatan : Terwujudnya ketetapan hukum atas keletakan situs/cagar budaya

k. Nama aktifitas	:	PEMBEBASAN DAN SERTIFIKASI TANAH CANDI PLAOSAN KABUPATEN KLATEN DAN SITUS LIYANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Tempat pelaksanaan	:	Kabupaten Klaten dan Kabupaten Temanggung
Waktu pelaksanaan	:	Januari – Desember 2014
Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
Pelaksana Kegiatan	:	Pelaksana dilakukan oleh oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan jasa konsultan penilai harga tanah dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
Progress kegiatan	:	Dalam pelaksanaan
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pihak terkait</li> <li>- Penilaian harga tanah oleh tim penilai independen</li> <li>- Musyawarah dengan pemilik tanah</li> <li>- Pengukuran tanah</li> <li>- Berita acara pelepasan dan administrasi pembayaran tanah</li> <li>- Pembelian tanah</li> </ul>

I.	Nama aktifitas	:	SEWA TANAH UNTUK JALAN MASUK CANDI NGEMPON KABUPATEN SEMARANG, SEWA TANAH PARIT KUNO SISI UTARA KOMPLEKS CANDI PLAOSAN LOR KABUPATEN KLATEN
	Tempat pelaksanaan	:	Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten
	Waktu pelaksanaan	:	Januari 2014, Juni 2014
	Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
	Pelaksana Kegiatan	:	Personil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
	Progress kegiatan	:	Telah dilaksanakan
	Hasil Kegiatan	:	Terwujudnya ketetapan hukum atas keletakan situs/cagar budaya
m.	Nama aktifitas	:	EKSKAVASI PENYELAMATAN SITUS LIYANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHAP IV
	Tempat pelaksanaan	:	Kabupaten Temanggung
	Waktu pelaksanaan	:	Juni – Oktober 2014
	Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
	Pelaksana Kegiatan	:	Pelaksana dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan jasa alat-alat berat dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

- Progress kegiatan : Dalam pelaksanaan
- Hasil Kegiatan : - Penggalian tanah  
- Penemuan data-data arkeologis berupa :  
✓ Menemukan terusan struktur talud selasar ke arah barat laut dengan ukuran 19.80 x 1 m  
✓ Sisa struktur batur (?) bagian sisi barat daya dengan ukuran panjang 175 cm, tinggi 40 cm yang terdiri 3 lapis batu dan sisa struktur sisi tenggara yang berukuran panjang 210 cm dengan tinggi 25 cm yang terdiri 2 lapis batu.  
✓ Arang papan yang berukuran 3 x 165 x 45 cm, arang ini ditemukan di sebelah tenggara temuan sisa struktur batur, arang ditemukan pada lapisan pasir di atas tanah asli 50 cm.  
✓ Terusan pagar talud yang mengarah ke barat laut serta tangga masuk  
✓ Lingga pathok /yasti (?)  
✓ Arang tiang, arang ini masih berbentuk glondongan kayu yang berukuran panjang 150 cm, diamter bagian tengah 35 cm, diameter bagian ujung 28 cm. Arang ini diperkirakan bekas tiang bangunan karena pada ujung kayu tersebut terdapat dua poros atau lubang persegi yang berfungsi untuk mengaitkan blandar atau kayu melintang

Dokumentasi Kegiatan :



*Pembukaan tanah*



*Penemuan sisa arang kayu*



*Penemuan terusan struktur talud, pagar dan tangga masuk*

### 3. Output Cagar Budaya yang Diinventarisasi

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 110 (seratus sepuluh) cagar budaya dengan aktifitas berupa pelaksanaan inventarisasi.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 645 (enam ratus puluh lima) cagar budaya dengan prosentase 586,36 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.939.700,00 atau sebesar 59,32 persen.

Berikut uraian dari masing-masing aktifitas di Output Cagar Budaya yang diinventarisasi, yaitu :

- a. Nama aktifitas : INVENTARISASI CAGAR BUDAYA BERGERAK KABUPATEN SEMARANG
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Semarang

Waktu pelaksanaan	:	Maret – April 2014
Metode Pelaksanaan	:	Swakelola
Pelaksana Kegiatan	:	Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Progress kegiatan	:	Telah dilaksanakan
Hasil Kegiatan	:	Terinventarisasinya 645 benda bergerak sebagai potensi cagar budaya di wilayah Propinsi Jawa Tengah
Dokumentasi kegiatan	:	



*Potensi cagar budaya*

#### 4. Output Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 1 (satu) naskah dengan aktifitas berupa kajian pengembangan dan pemanfaatan.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 0 (nol) naskah dengan prosentase 0,00 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Aktifitas dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tengah tahun kedua.

## 5. Output Peserta Internalisasi Cagar Budaya


Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 3.063 (tiga ribu enam puluh tiga) peserta dengan aktifitas berupa pameran kepurbakalaan, sosialisasi Undang-Undang tentang Cagar Budaya, pemberian penghargaan pelestari cagar budaya, dan cetak buku.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 63 (enam puluh tiga) peserta dengan prosentase 2,06 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.461.900,00 atau sebesar 11,17 persen.

Berikut uraian masing-masing aktifitas di Output Peserta Internalisasi Cagar Budaya :

- a. Nama aktifitas : KEGIATAN SOSIALISASI CAGAR BUDAYA UNTUK TENAGA PENDIDIK MGMP SEJARAH DAN INSTANSI – INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- Tempat pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar
- Waktu pelaksanaan : Maret – April 2014
- Metode Pelaksanaan : Swakelola
- Pelaksana Kegiatan : Pelaksanaan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan pengadaan jasa paket meeting (halfday) dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.
- Progress kegiatan : Telah dilaksanakan

Hasil Kegiatan : Terwujudnya masyarakat yang sadar pelestarian cagar budaya

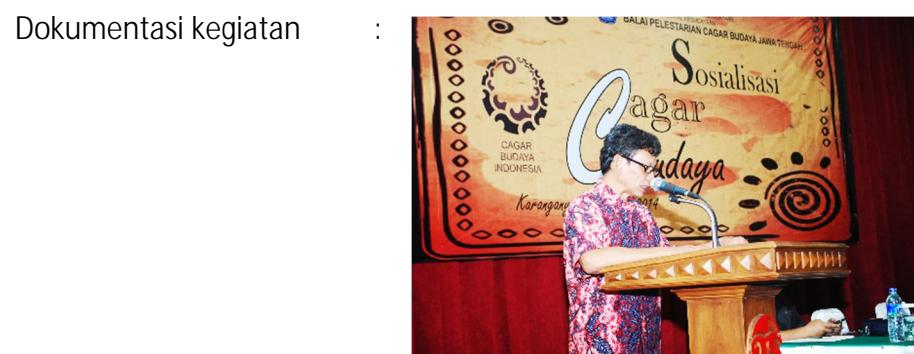

Pembukaan acara



Pemaparan narasumber



*Diskusi dan tanya jawab*

- b. Nama aktifitas : PEMBERIAN KOMPENSASI PELESTARI CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG  
Tempat pelaksanaan : Kota Semarang  
Waktu pelaksanaan : Mei – Juni 2014  
Metode Pelaksanaan : Swakelola  
Pelaksana Kegiatan : Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah  
Progress kegiatan : Telah dilaksanakan  
Hasil Kegiatan : Terwujudnya masyarakat yang sadar pelestarian cagar budaya

Dokumentasi kegiatan :



*Peninjauan bangunan*



*Rapat penilaian*



*Penyerahan kompensasi*



*Penyerahan kompensasi*

## 6. Output Dokumen Pelestarian Cagar Budaya

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 1 (satu) dokumen dengan aktifitas berupa pemetaan kawasan cagar budaya dan penyusunan naskah buku.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 1 (satu) dokumen dengan prosentase 50,00 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.494.700,00 atau sebesar 3,22 persen.

Berikut uraian dari masing-masing aktifitas di dalam Output Dokumen Pelestarian Cagar Budaya :

- a. Nama aktifitas : Penyusunan Naskah Buku Arsitektur Kolonial di Jawa Tengah  
Tempat pelaksanaan : Kantor BPCB Jawa Tengah  
Waktu pelaksanaan : Januari – Maret 2014  
Metode Pelaksanaan : Swakelola  
Pelaksana Kegiatan : Tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah  
Progress kegiatan : Telah dilaksanakan  
Hasil Kegiatan : Dokumen pelestarian cagar budaya  
Dokumentasi Kegiatan : A row of four photographs showing different examples of colonial architecture in Java. From left to right: 1. A large, multi-story building with a prominent dome and classical columns, possibly a former government office or church. 2. A two-story building with a central arched entrance, surrounded by trees. 3. A white, single-story building with a tiled roof and arched windows, typical of Dutch colonial design. 4. A larger, two-story building with a traditional tiled roof and a prominent entrance, possibly a former residence or institutional building.

*Bangunan berarsitektur kolonial*

## 7. Output Peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta dengan aktifitas berupa pelatihan konservasi logam dan pelatihan teknik pengukuran.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 0 (nol) peserta dengan prosentase 0,00 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Aktifitas direncanakan dilaksanakan pada tengah tahun kedua.

#### 8. Output Layanan Perkantoran

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 12 (dua belas) bulan layanan dengan aktifitas berupa pembayaran gaji dan tunjangan dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 6 (enam) bulan layanan dengan prosentase 50,00 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp 8.728.434.561,00 atau sebesar 38,12 persen.

#### 9. Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit dengan aktifitas berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 0 (nol) unit perangkat pengolah data dan komunikasi dengan prosentase 0,00 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Aktifitas sedang dalam proses lelang sederhana pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.

#### 10. Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) unit dengan aktifitas berupa pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 0 (nol) unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan prosentase 0,00 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Aktifitas sedang dalam proses lelang sederhana pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.

#### 11. Output Gedung/Bangunan

Pada Tahun 2014, ditetapkan target sebanyak 1.107 m<sup>2</sup> dengan aktifitas berupa Renovasi Gedung Storage, Ruang Gelap, Ruang Sarana Prasarana, Parkir, Tempat Genset dan Ruang Koleksi BPCB Jawa Tengah.

Secara target capaian hingga tengah tahun 2014 telah tercapai sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan prosentase 0,00 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.577.400,00 atau sebesar 2,34 persen.

Nama aktifitas	:	Renovasi Gedung Storage, Ruang Gelap, Ruang Sarana Prasarana, Parkir, Tempat Genset dan Ruang Koleksi BPCB Jawa Tengah
Tempat pelaksanaan	:	Kabupaten Klaten
Waktu pelaksanaan	:	Maret – Desember 2014
Metode Pelaksanaan	:	Kontraktual
Pelaksana Kegiatan	:	Perencanaan, Pelaksanaan konstruksi dan Pengawasan dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk pengelolaan kegiatan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Progress kegiatan	:	Dalam pelaksanaan

- Hasil Kegiatan :
- Pengadaan langsung untuk konsultan perencana
  - Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan BPCB Jawa Tengah
  - Dalam proses e-lelang pemilihan langsung untuk pelaksana konstruksi dan pengadaan langsung untuk konsultan pengawas.

- Dokumentasi kegiatan :



*Presentasi draft karya perencanaan*



*Diskusi dan tanya jawab*

### C. REALISASI ANGGARAN

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 36.635.730.000,00, sampai dengan tengah tahun 2014 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 10.772.144.306,00 atau sebesar 29,47 persen. Berikut grafik target dan realisasi anggaran sampai dengan tengah tahun 2014 :

